



(仮称) 狸平トンネル

ためきだいら通信



現在の施工状況

日頃から(仮称)狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。トンネル掘削は、7/20現在で420m程進んでいます。8月は非常駐車帯の掘削も行います。掘削切羽面からの湧水はあまりありませんが、下半下部から水が湧いていて走路はいつも湿っています。引き続き、掘削作業は慎重に行っていきます。又、セントル(移動式型枠)の組立も終わり、覆工コンクリートは盆前までに5回の打設を予定しております。盆明けには、起点側坑口の坑門工に取り掛かります。終点側では、擁壁の鉄筋型枠コンクリート打設作業を行います。

現場の夏期休業の予定は、8/11～20日となっています。毎日の点検パトロールは行います。

今後も引き続き、安全に留意しながら工事をすすめて参りますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。

起点側



セントル(移動型枠)



今後も引き続き”安全第一”で工事を進めてまいります！！



現場からのお知らせ



発生土受入地の水質モニタリングについて発生土受入地周辺の水質調査を、全15か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。(表の値は下図の河川水の調査結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)


水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005※ mg/L以下	0.01 mg/L以下
ふっ素	0.05※ mg/L以下	0.8 mg/L以下

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっています
測定日: 令和5年7月7日

奈川地区土運搬状況

7月20現在
7,922m³/60,000m³
(実績/土置場容量)

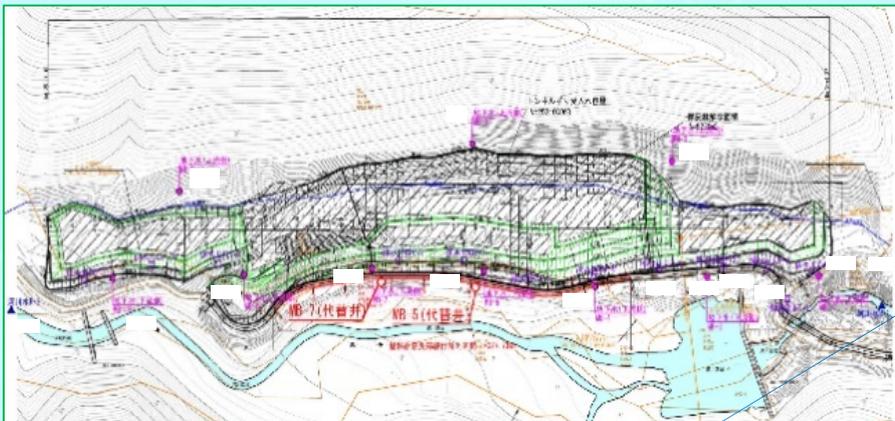

測定点 (森の子養魚場様上流)

7月20日時点 420mまで掘削完了



発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
松本市大字島立1020
TEL 0263 - 40 - 1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
松本市安曇154
TEL 0263 - 88 - 6422
