

【様式 1 - 1】

松本市橋梁長寿命化修繕計画



令和6年（2024年）3月

長野県 松本市

目 次

1. 老朽化対策における基本方針	
1) 長寿命化修繕計画の背景	----- 1
2) 基本的な方針	----- 2
3) 計画の概要	----- 3
①目的	
②計画期間	
③管理橋梁	
④健全性の判定区分の割合	
⑤修繕等措置の着手状況	
⑥対策の優先順位の考え方や目標	
2. 新技術等の活用方針	----- 7
1) 新技術等の活用に関する考え方や取り組み	
2) 新技術等の活用に関する目標	
3) 短期的な数値目標とコスト縮減効果	
3. 費用の縮減に関する具体的な方針	----- 7
1) 費用の縮減を図るための考え方や取り組み	
2) 費用の縮減目標	
4. 個別の構造物ごとの事項【様式1-2】	
(諸元、直近の点検結果及び次回点検年度、対策内容等)	

1. 老朽化対策における基本方針

1) 長寿命化修繕計画の背景

松本市では、令和6年（2024年）3月現在で、橋長2m以上の橋梁を993橋管理しています。これらの橋梁は、高度経済成長期を含む1970年代から1980年代の約20年間に集中して建設されており、多くの橋梁が今後一斉に高齢化を迎えることになります。

また、厳しい財政状況のなかで、合理的・効果的な手法による資産の維持管理が強く求められており、今後増大が見込まれる橋梁の修繕や架け替えに要するコストを長寿命化対策によって可能な限り縮減する必要があります。

一方、平成24年12月に起こった『中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故』を受け、国はトンネルや橋梁等の道路ストックの総点検を行うとともに、道路の老朽化対策の本格実施に舵を切りました。

橋梁においては、橋長2m以上の橋梁に対して5年に1度の定期点検が義務付けられ、平成26年6月に「道路橋定期点検要領」が整備されました。


このような背景から、松本市では、平成24年度に「松本市橋梁長寿命化修繕計画」を策定し計画的な修繕に取り組んできました。

今回、最新の定期点検結果（R1～R5）を基に、今後5年間の取り組みの方向性と対策等を示す第三期修繕計画を策定します。

（修繕計画の策定状況）

第一期修繕計画	平成24年度策定	対象橋梁	477橋（橋長5m以上）
第二期修繕計画	平成30年度策定	対象橋梁	988橋
第三期修繕計画	令和5年度策定	対象橋梁	993橋

松本市が管理する橋梁 993 橋の高齢化の推移（現在→20 年後）

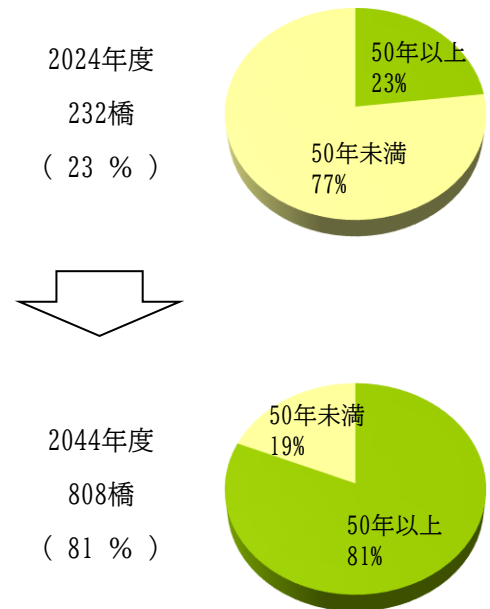

2) 基本的な方針

点検、診断、措置、記録からなるメンテナンスサイクル（5ヵ年）を定着化させ、効率的・効果的な維持管理を実施します。

計画的な修繕の実施により、橋梁構造の安全性を確保するとともに、従来の“壊れたら直す”対症療法型”の維持管理から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型”への転換を進め、将来的な維持管理費用の縮減を図ります。

■日常的な維持管理

道路パトロール車による巡回を実施し、異常の早期発見に努めるとともに、維持工事（作業）で実施できる以下の予防措置を行います。

- ・ 橋面や路肩の清掃
 - ・ 排水枥・排水管の土砂づまりの撤去
 - ・ 支承付近に堆積した土砂の撤去
 - ・ 路面の段差解消
- 直営の土木センター
(随時実施)

■定期点検による健全度の把握

国土交通省『定期点検要領』に準じる定期点検（近接目視）を5年に1度の頻度で実施し、損傷状況（健全度）を把握します。

■応急措置

道路パトロールや定期点検により、安全性に係わる施設の異常が発見された場合は、速やかに応急措置を行います。

■修繕

損傷部材の修繕に加え、トータルコストを勘案した合理的・効果的な予防保全型の修繕を行っていきます。また、損傷要因を排除（対策）することにより、損傷の進行と再劣化による補修コストの増大を防ぎます。

3) 計画の概要

①目的

長寿命化修繕計画は、従来の対症療法型の維持管理から、計画的かつ予防保全的な維持管理に転換を図り、安全で安心な道路サービスの提供を行うとともに、橋梁の耐用年数の延伸によるコストの縮減と予算の平準化を目的とします。

②計画期間

計画期間は、令和6年4月（2024年度）から令和11年3月（2028年度）の5年間とします。

③管理橋梁

本計画では、松本市で管理する橋長2m以上の橋梁 993 橋を対象とします。

全管理橋梁数	993 橋
長寿命化修繕計画の策定橋梁数	993 橋
鋼橋	408 橋
コンクリート橋	583 橋
上記以外	2 橋


(内訳)

地域区分	橋 長				計
	5m未満	5～10m	10～15m	15m以上	
旧 市	294	160	37	117	608
四賀地区	19	54	13	39	125
安曇地区	5	2	4	19	30
奈川地区	1	5	5	26	37
梓川地区	64	31	3	2	100
波田地区	63	23	5	2	93
計	446	275	67	205	993

また、橋梁の規模や構造系、使用状況によって管理方針を以下のとおり設定することにより、修繕費の平準化と架け替え橋梁の分散化を図ります。

管理方針	方針内容
予防保全型	損傷が大きくなる前に合理的・効果的な劣化対策や修繕を行う
使い切り型	更新（架け替え）や集約化・撤去を前提とした維持管理を行う 例) 道路橋示方書等の基準に合致していない橋梁 現状で利用を限定している橋梁 他計画（河川改修、改良計画等）がある橋梁

④健全性の判定区分の割合

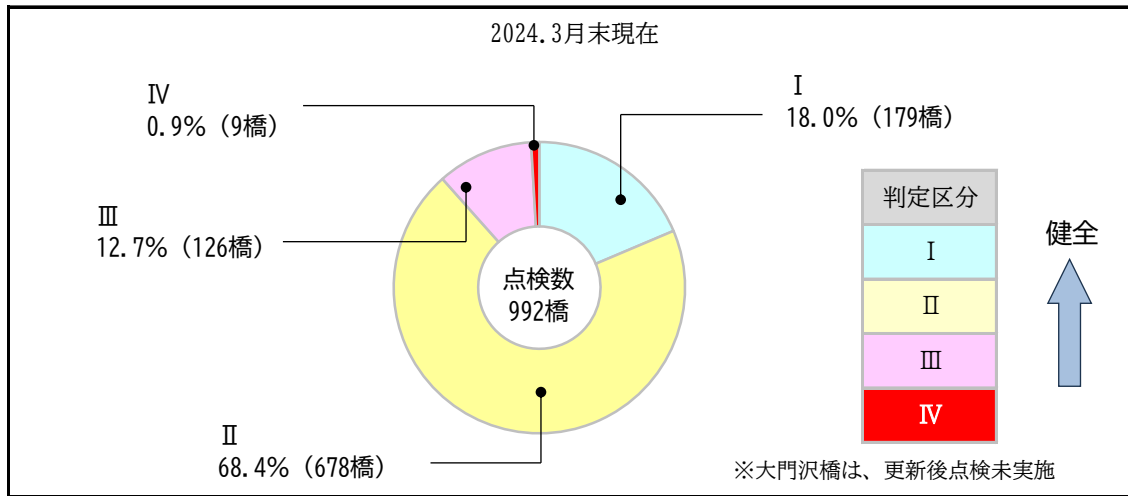

健全度の判定方法

区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状況
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状況
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く緊急に措置を講ずべき状態

⑤修繕等措置の着手状況

【様式1-2】参照

⑥対策の優先順位の考え方や目標

早期措置の必要性や、点検（診断）からの経過期間を加味するとともに、限られた予算内で、きめ細かい修繕を行っていくため、カテゴリー① と カテゴリー② に分類して優先順位を設定します。

カテゴリー①	橋長 5m以上の車道橋 および 本橋に併設した歩道橋	504橋
カテゴリー②	橋長 5m未満の車道橋・歩道橋	489橋
	橋長 5m以上の歩道橋	
	カルバート(暗渠)	

また、耐荷性および重要度について下表のとおり分類することにより、順位の高い橋梁を高く評価します。

重要度に耐荷性を加味した順位		橋梁ごとの重要度		
		60以上	30以上～60未満	30未満
耐荷性	30未満	1位	2位	4位
	30以上～60未満	3位	5位	6位
	60以上	7位	8位	9位

(2) カテゴリー①の耐荷性および重要度

◆耐荷性

$$\text{各部材毎の重み係数} \times \text{点検結果に対する評価点} = \text{損傷度}$$

$$\text{耐荷性} = 100 - \text{損傷度 (各部材毎の損傷度の合計)}$$

各部材毎の重み係数

部材項目	重み係数
上部工主部材	0.70
床版	0.70
下部工	0.30
支承	0.20
舗装	0.20
伸縮装置	0.10

点検結果に対する評価点

点検結果	評価点
I	0
II	20
III	60
IV	80

※損傷度が100以上の場合には耐荷性はゼロとします。

橋の健全性を相対的に点数で判定したもので、強度を数値的に示したものではありません。

◆重要度

$$\text{諸元重要度} = \Sigma (\text{重み係数} \times \text{評価点})$$

$$\text{重要度} = \text{各諸元重要度の合計}$$

諸元項目	重み係数	評価項目	評価点	諸元重要度
橋長	0.30	10m以上	100	30.0
		10m未満	0	0.0
交差状況	0.20	道路・鉄道	100	20.0
		河川・その他	0	0.0
除雪対応路線	0.20	1次路線・2次路線	100	20.0
		3次路線・新市対応路線	50	10.0
		その他	0	0.0
市街化区域	0.05	区域内	100	5.0
		区域外	0	0.0
通行状況	0.15	センターライン有り	100	15.0
		センターライン無し	50	7.5
		未使用橋梁等	0	0.0
地震時に通行を確保する道路	0.10	指定有り	100	10.0
		指定無し	0	0.0

※諸元項目、評価項目、重み係数は松本市の地域性を考慮して設定しています。

(2) カテゴリー②の耐荷性および重要度

カテゴリー①と同様に、社会的重要性を数値化した重要度を基に修繕の優先順位を判断します。但し、用いる項目や係数が異なります。

◆耐荷性

$$\text{各部材毎の重み係数} \times \text{点検結果に対数評価点} = \text{損傷度}$$

$$\text{耐荷性} = 100 - \text{損傷度 (各部材毎の損傷度の合計)}$$

部材項目	重み係数
上部工主部材	0.80
床版	0.80
下部工	0.40
舗装	0.20
伸縮装置	0.10

点検結果	評価点
I	0
II	20
III	40
IV	80

◆重要度

$$\text{諸元重要度} = \Sigma (\text{重み係数} \times \text{評価点})$$

$$\text{重要度} = \text{各諸元重要度の合計}$$

諸元項目	重み係数	評価項目	評価点	諸元重要度
幅員	0.15	10m以上	100	15.0
		10m未満	50	7.5
		5m未満	0	0.0
迂回路	0.15	無し	100	15.0
		有り	0	0.0
除雪対応路線	0.25	1次路線・2次路線	100	25.0
		3次路線・新市対応路線	50	12.5
		その他	0	0.0
市街化区域	0.20	区域内	100	20.0
		区域外	0	0.0
通行状況	0.25	センターライン有り	100	25.0
		センターライン無し	50	12.5
		歩道	0	0.0

※諸元項目、評価項目、重み係数は松本市の地域性を考慮して設定しています。

2. 新技術等の活用方針

1) 新技術の活用に関する考え方や取り組み

点検、修繕の実施にあたっては、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。

2) 新技術の活用に関する目標

修繕の実施（維持工事、小規模修繕を除く）にあたり、設計段階で新技術の活用を検討し、約5割の修繕工事において新技術の活用を目指します。

2巡目定期点検（R1～R5）にて大型点検車やロープアクセスを使用した橋梁について、新技術の活用を重点的に検討し、3巡目定期点検（R6～R10）において約100万円のコスト縮減を目指します。

3) 短期的な数値目標とコスト縮減効果

3巡目定期点検において、小規模橋梁を対象とした「橋梁点検業務支援システム」を導入し、直営点検の作業効率化を図ります。また、作業の効率化に伴い、直営点検数を5ヵ年で40橋増やすことにより、150万円/年のコスト縮減を図ります。

3. 費用の縮減に関する具体的な方針

1) 費用の縮減を図るための考え方や取り組み

予防保全型管理へ転換することによりトータルコストの縮減を図ります。また、社会情勢や利用状況の変化、地元の意見等を踏まえながら、施設の集約化・撤去、機能縮小等を進め更なるコスト縮減を図ります。


（実施目標）

- | | | |
|--------------|-------|-----------------|
| ・集約化・撤去、機能縮小 | 5橋 | 【期間：R6年度～R10年度】 |
| ・コスト縮減効果 | 150万円 | 【期間：R6年度～R15年度】 |

2) 費用の縮減目標

対象橋梁993橋について、予防保全型の維持管理手法を用いた場合、従前の対症療法型と比べ、50年間で 約50% の事業費削減が見込まれています。

計画的な修繕を進めることにより、予防保全型管理への転換を図っていきます。

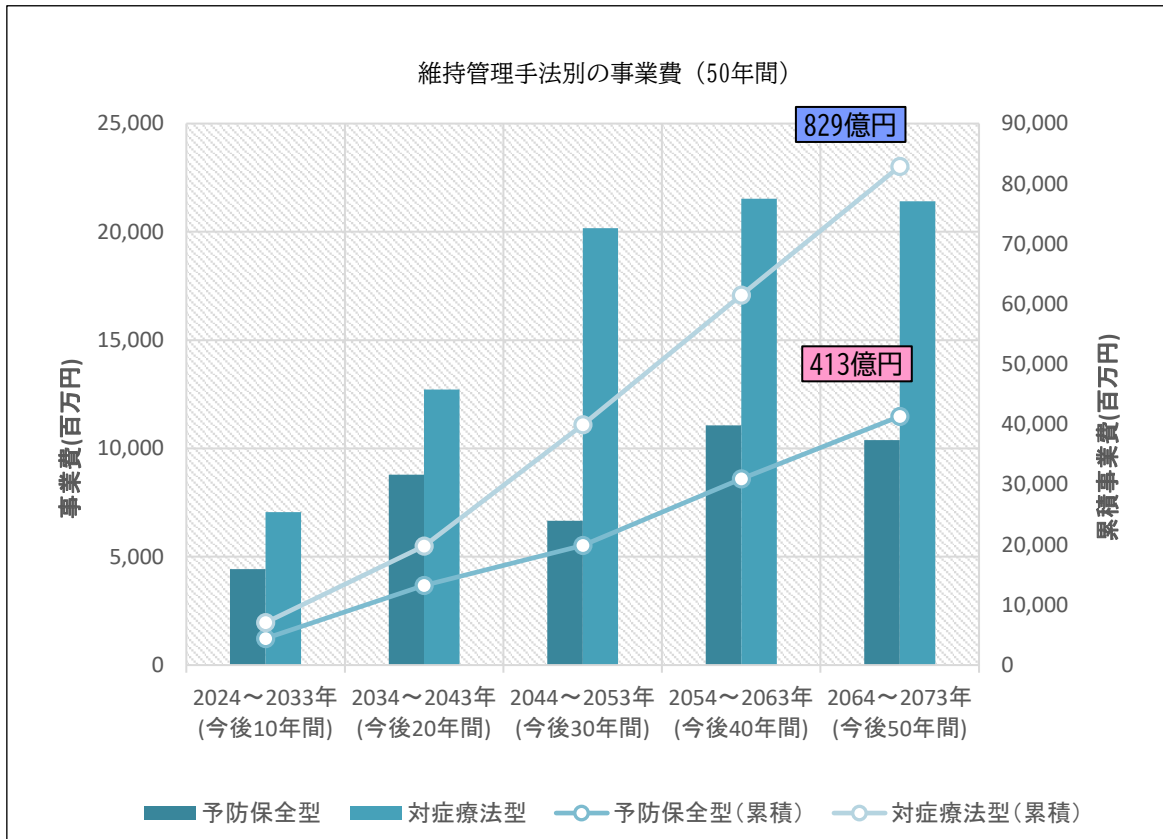

4. 個別構造物ごとの事項

【様式1-2】

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長(m)	橋種	所在地	架設年度	直近点検年度	判定区分	次回点検年度	概算費用(百万円)	対策着手年度	対策完了	対策内容
下田2号橋	5.7	PC橋	旧市	1965	2020	Ⅱ	2025				
本村橋	25.5	PC橋	旧市	1995	2022	Ⅱ	2026				
坂下こ線道路橋	30.1	鋼橋	旧市	1992	2023	Ⅲ	2028		2028	2028	修繕
山田棧道橋	25.5	RC橋	旧市	1983	2022	Ⅲ	2027		2027	2028	修繕
平瀬橋	14.4	PC橋	旧市	1998	2019	Ⅱ	2024				
拾ヶ堰橋	14.5	PC橋	旧市	1972	2019	Ⅱ	2024				
学北橋	9.1	RC橋	旧市	1972	2019	Ⅲ	2024			(2021)	(修繕済)
町中央橋	8.1	RC橋	旧市	1971	2019	Ⅰ	2024				
公事川原橋	12.7	PC橋	旧市	1996	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(13029)	5.0	RC橋	旧市	1955	2019	Ⅰ	2024				
ウォーター・フィルド橋	19.5	PC橋	旧市	1993	2020	Ⅰ	2025				
新池北橋	5.7	RC橋	旧市	1977	2019	Ⅱ	2024				
無名橋(13032)	5.2	RC橋	旧市	1973	2019	Ⅱ	2024				
無名橋(13034)	5.0	RC橋	旧市	1964	2019	Ⅱ	2024				
巾下橋	11.7	PC橋	旧市	1957	2019	Ⅰ	2024				
元沢橋	8.4	PC橋	旧市	1965	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(13062)	5.3	RC橋	旧市	1982	2020	Ⅱ	2025				
無名橋(13074)	8.2	RC橋	旧市	1962	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(13089)	6.1	RC橋	旧市	1998	2020	Ⅱ	2025				
スポーツ橋	47.2	PC橋	旧市	1989	2021	Ⅱ	2026				
長寿橋	51.6	PC橋	旧市	1993	2021	Ⅱ	2026				
白金橋	12.7	PC橋	旧市	1992	2019	Ⅰ	2024				
宮北橋	31.0	PC橋	旧市	1998	2022	Ⅱ	2027				
原橋	51.0	RC橋	旧市	1965	2020	Ⅱ	2025				
原橋歩道橋	51.0	鋼橋	旧市	1978	2020	Ⅱ	2025				
無名橋(14002)	5.4	RC橋	旧市	1961	2019	Ⅰ	2024				
樽木堰橋	9.9	RC橋	旧市	1990	2019	Ⅰ	2024				
新村堰橋	5.0	RC橋	旧市	1963	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(14027)	5.1	RC橋	旧市	1990	2020	Ⅱ	2025				
無名橋(14030)	5.3	RC橋	旧市	1990	2020	Ⅱ	2025				
無名橋(14031)	6.2	RC橋	旧市	1990	2020	Ⅱ	2025				
無名橋(14036)	5.4	PC橋	旧市	1980	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(14043)	6.4	PC橋	旧市	1972	2019	Ⅲ	2024		2026	2028	修繕
渡場橋	5.1	RC橋	旧市	1983	2020	Ⅱ	2025				
中田橋	7.6	RC橋	旧市	1979	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(14072)	5.4	PC橋	旧市	1970	2020	Ⅰ	2025				
渚西橋	7.5	PC橋	旧市	1968	2019	Ⅰ	2024				
両島橋	8.2	RC橋	旧市	1963	2019	Ⅰ	2024				
八幡橋	7.0	RC橋	旧市	1954	2019	Ⅱ	2024				
宮本上橋	7.8	RC橋	旧市	1997	2019	Ⅱ	2024				
無名橋(14097)	8.6	PC橋	旧市	1988	2019	Ⅰ	2024				
渚南橋	7.4	PC橋	旧市	1970	2019	Ⅰ	2024				
征矢野川橋	7.2	RC橋	旧市	1963	2019	Ⅱ	2024				
穴田川橋	10.5	PC橋	旧市	1960	2019	Ⅰ	2024				
沢村橋	5.0	RC橋	旧市	1984	2020	Ⅱ	2025				
新開智橋	6.1	RC橋	旧市	1966	2019	Ⅰ	2024				
城北橋	8.1	RC橋	旧市	1970	2019	Ⅲ	2024			(2020)	(修繕済)
城北橋歩道橋	8.1	RC橋	旧市	1970	2022	Ⅰ	2027				
東蟻ヶ崎橋	6.0	RC橋	旧市	1963	2020	Ⅰ	2025				
大門沢橋	6.6	BOX橋	旧市	2023			2027				
宮崎橋	5.5	RC橋	旧市	1956	2019	Ⅲ	2024		2026	2028	修繕
無名橋(14125)	7.7	RC橋	旧市	1979	2019	Ⅱ	2024				
鎌田橋	8.2	RC橋	旧市	1974	2019	Ⅱ	2024				
鎌田橋歩道橋	8.5	鋼橋	旧市	1974	2023	Ⅲ	2028		2022	2024	修繕
古城橋	6.7	PC橋	旧市	1980	2019	Ⅰ	2024				
無名橋(14132)	6.6	鋼橋	旧市	1974	2019	Ⅲ	2024		2023	2024	修繕
無名橋(14133)	9.3	RC橋	旧市	1964	2019	Ⅰ	2024				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
無名橋 (14134)	8.1	RC橋	旧市	1964	2022	IV	2027		2025	2027	更新
城田橋	5.1	RC橋	旧市	1969	2020	II	2025				
深志橋	22.6	鋼橋	旧市	1993	2021	III	2026		2023	2028	修繕
合流橋	8.0	PC橋	旧市	1962	2019	I	2024				
湯川橋	7.3	PC橋	旧市	1978	2019	I	2024				
無名橋 (14156)	5.5	RC橋	旧市	1992	2019	II	2024				
無名橋 (14157)	5.8	RC橋	旧市	1983	2019	III	2024			(2023)	(修繕済)
無名橋 (14158)	5.5	RC橋	旧市	1974	2019	II	2024				
清水元町橋	6.4	RC橋	旧市	1987	2019	II	2024				
清水境橋	8.0	PC橋	旧市	1970	2019	I	2024				
藤井橋	12.4	PC橋	旧市	1991	2019	I	2024				
無名橋 (14176)	5.1	RC橋	旧市	1996	2020	II	2025				
無名橋 (14178)	7.7	RC橋	旧市	1967	2019	II	2024				
竹室橋	10.6	PC橋	旧市	2009	2019	I	2024				
無名橋 (14188)	5.3	RC橋	旧市	1997	2019	II	2024				
駒越1号橋	13.3	PC橋	旧市	1986	2019	III	2024			(2023)	(修繕済)
無名橋 (14190)	8.1	RC橋	旧市	1981	2019	II	2024				
無名橋 (14191)	6.1	RC橋	旧市	1981	2019	I	2024				
無名橋 (14192)	7.2	RC橋	旧市	1996	2019	I	2024				
無名橋 (14194)	5.5	RC橋	旧市	1974	2019	II	2024				
無名橋 (14202)	6.7	鋼橋	旧市	1983	2022	III	2027				(規制)
無名橋 (14203)	6.3	PC橋	旧市	1981	2020	I	2025				
無名橋 (14205)	6.0	RC橋	旧市	1980	2019	I	2024				
無名橋 (14206)	8.1	RC橋	旧市	1997	2019	II	2024				
無名橋 (14211)	7.2	RC橋	旧市	1981	2019	I	2024				
無名橋 (14214)	5.8	RC橋	旧市	1983	2019	I	2024				
無名橋 (14215)	5.7	RC橋	旧市	1983	2019	II	2024				
無名橋 (14224)	5.5	RC橋	旧市	1984	2019	II	2024				
奈良井橋	97.0	PC橋	旧市	2006	2021	II	2026				
白姫橋	26.4	鋼橋	旧市	1984	2021	II	2026				
赤木一号橋	7.4	RC橋	旧市	1983	2019	I	2024				
両島橋	127.3	PC橋	旧市	1993	2021	II	2026				
無名橋 (14237)	5.4	RC橋	旧市	1996	2020	II	2025				
無名橋 (14238)	9.5	PC橋	旧市	1996	2019	I	2024				
無名橋 (14240)	5.3	RC橋	旧市	1996	2020	II	2025				
無名橋 (14250)	10.2	RC橋	旧市	1983	2019	I	2024				
無名橋 (14252)	5.0	RC橋	旧市	1990	2020	II	2025				
無名橋 (14255)	6.5	RC橋	旧市	1974	2019	I	2024				
無名橋 (14268)	7.4	PC橋	旧市	2012	2022	I	2027				
海岸寺沢橋	10.0	鋼橋	旧市	2011	2023	II	2028				
埴沢橋	9.0	鋼橋	旧市	2009	2023	I	2028				
無名橋 (15003)	8.0	PC橋	旧市	1983	2019	I	2024				
無名橋 (15005)	5.6	PC橋	旧市	1983	2020	I	2025				
無名橋 (15006)	5.3	PC橋	旧市	1975	2020	II	2025				
無名橋 (15024)	8.4	PC橋	旧市	1983	2019	I	2024				
無名橋 (15027)	9.4	RC橋	旧市	1983	2019	II	2024				
無名橋 (15033)	6.5	RC橋	旧市	1983	2019	II	2024				
上手橋	7.6	RC橋	旧市	1991	2019	I	2024				
日影橋	11.5	RC橋	旧市	1991	2019	I	2024				
乃木橋	8.5	RC橋	旧市	1991	2019	I	2024				
井川城中央橋	7.0	RC橋	旧市	1994	2019	II	2024				
無名橋 (15090)	7.5	RC橋	旧市	1974	2019	III	2024			(2021)	(修繕済)
第二井川城橋	7.9	PC橋	旧市	1974	2019	II	2024				
並柳北橋	11.0	PC橋	旧市	1978	2019	I	2024				
弘法山古墳橋	13.7	PC橋	旧市	1990	2019	I	2024				
生妻橋	12.5	PC橋	旧市	1982	2019	II	2024				
北河原橋	5.0	RC橋	旧市	1975	2020	II	2025				
井刈橋	7.6	RC橋	旧市	1982	2019	I	2024				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
無名橋 (15111)	5.3	RC橋	旧市	1980	2020	Ⅱ	2025				
沢田橋	5.0	RC橋	旧市	1979	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (15117)	5.0	RC橋	旧市	1965	2019	Ⅱ	2024				
藤見橋	13.5	PC橋	旧市	1956	2019	Ⅱ	2024				
大岩橋	10.4	PC橋	旧市	1956	2020	Ⅱ	2025				
清見橋	13.5	PC橋	旧市	1956	2019	Ⅱ	2024				
白砂橋	13.5	PC橋	旧市	1956	2019	Ⅱ	2024				
馬橋	7.9	RC橋	旧市	1990	2019	Ⅰ	2024				
堀川尻橋	7.3	PC橋	旧市	1988	2019	Ⅰ	2024				
井川橋	5.3	RC橋	旧市	1987	2020	Ⅱ	2025				
無名橋 (15129)	5.4	RC橋	旧市	1970	2019	Ⅰ	2024				
無名橋 (15130)	5.4	RC橋	旧市	1971	2019	Ⅰ	2024				
弥生橋	7.2	RC橋	旧市	1998	2019	Ⅱ	2024				
砂田橋	5.3	RC橋	旧市	1982	2019	Ⅰ	2024				
七廻橋	6.3	RC橋	旧市	1979	2019	Ⅰ	2024				
美牧橋	10.8	PC橋	旧市	1981	2019	Ⅱ	2024				
みとれ橋	11.4	PC橋	旧市	1981	2019	Ⅲ	2024			(2020)	(修繕済)
無名橋 (15150)	9.0	RC橋	旧市	1986	2019	Ⅱ	2024				
庄内橋	37.6	鋼橋	旧市	1992	2022	Ⅲ	2027	2025	2026		修繕
無名橋 (15166)	7.8	RC橋	旧市	1985	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15167)	12.0	PC橋	旧市	2000	2019	Ⅰ	2024				
無名橋 (15168)	6.4	RC橋	旧市	1978	2019	Ⅰ	2024				
平田陸橋	154.2	PC橋	旧市	2007	2023	Ⅱ	2028				
三間沢4号橋	28.6	PC橋	旧市	2000	2020	Ⅱ	2025				
三間沢3号橋	28.5	PC橋	旧市	2002	2022	Ⅰ	2027				
三間沢2号橋	27.7	PC橋	旧市	2001	2020	Ⅱ	2025				
三間沢1号橋	27.2	PC橋	旧市	1999	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16035)	9.2	RC橋	旧市	1968	2019	Ⅰ	2024				
塩澤橋	11.2	鋼橋	旧市	1963	2019	Ⅱ	2024				
砦橋	9.2	PC橋	旧市	1968	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (16038)	10.7	RC橋	旧市	1998	2019	Ⅱ	2024				
真田橋	10.3	RC橋	旧市	1997	2020	Ⅱ	2025				
新田4号橋	7.1	RC橋	旧市	1979	2020	Ⅱ	2025				
塩沢2号橋	9.9	PC橋	旧市	1980	2020	Ⅱ	2025				
新田3号橋	6.4	RC橋	旧市	1979	2020	Ⅱ	2025				
新田2号橋	7.5	RC橋	旧市	2000	2020	Ⅰ	2025				
新田1号橋	6.7	RC橋	旧市	1980	2020	Ⅰ	2025				
中村3号橋	6.9	RC橋	旧市	1981	2020	Ⅰ	2025				
中村2号橋	5.3	RC橋	旧市	1982	2020	Ⅱ	2025				
長田橋	11.9	RC橋	旧市	1974	2020	Ⅲ	2025			(2021)	(修繕済)
山岸橋	5.5	RC橋	旧市	1979	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16049)	10.3	RC橋	旧市	1986	2020	Ⅰ	2025				
中村1号橋	7.1	RC橋	旧市	1982	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16054)	5.6	RC橋	旧市	1971	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16056)	7.0	RC橋	旧市	2003	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16057)	7.2	RC橋	旧市	2000	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16058)	8.7	RC橋	旧市	2000	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16059)	5.0	RC橋	旧市	1967	2020	Ⅰ	2025				
無名橋 (16062)	6.0	RC橋	旧市	1979	2020	Ⅱ	2025				
牛伏寺橋	20.9	RC橋	旧市	1992	2022	Ⅲ	2027	2027	2028		修繕
無名橋 (16071)	5.0	RC橋	旧市	1998	2020	Ⅱ	2025				
無名橋 (16072)	5.5	RC橋	旧市	1969	2020	Ⅱ	2025				
明神一号橋	6.4	PC橋	旧市	1965	2020	Ⅱ	2025				
明神二号橋	10.1	RC橋	旧市	1987	2020	Ⅱ	2025				
群鷹橋	13.0	鋼橋	旧市	1974	2020	Ⅲ	2025	2023	2026		修繕
上瀬黒橋	34.0	PC橋	旧市	1988	2021	Ⅱ	2026				
棚峯橋	43.5	PC橋	旧市	1994	2021	Ⅱ	2026				
無名橋 (16081)	5.8	RC橋	旧市	1996	2020	Ⅰ	2025				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
臨空夢大橋	41.0	PC橋	旧市	2002	2020	Ⅱ	2024				
三間沢7号橋	29.7	PC橋	旧市	2003	2022	Ⅱ	2027				
無名橋(16088)	7.6	RC橋	旧市	1980	2020	Ⅱ	2025				
荒井橋	10.5	PC橋	旧市	1973	2020	Ⅱ	2025				
無名橋(17007)	10.0	PC橋	旧市	1993	2020	Ⅲ	2025			(2021)	(修繕済)
昭和橋	13.2	鋼橋	旧市	1961	2020	Ⅱ	2025				
横林橋	7.4	RC橋	旧市	1986	2020	Ⅰ	2025				
連岳橋	9.7	RC橋	旧市	1980	2020	Ⅰ	2025				
赤木橋	9.6	RC橋	旧市	1985	2020	Ⅱ	2025				
赤木1号橋	9.5	RC橋	旧市	1985	2020	Ⅰ	2025				
南洞橋	11.2	RC橋	旧市	1985	2020	Ⅰ	2025				
無名橋(17018)	8.8	RC橋	旧市	1993	2020	Ⅱ	2025				
塩沢橋	25.0	PC橋	旧市	1985	2022	Ⅱ	2027				
無名橋(17020)	6.5	RC橋	旧市	1981	2020	Ⅱ	2025				
北洞橋	7.5	RC橋	旧市	1983	2020	Ⅰ	2025				
赤木3号橋	7.1	RC橋	旧市	1984	2020	Ⅱ	2025				
赤木2号橋	7.2	RC橋	旧市	1984	2020	Ⅱ	2025				
中洞川橋	10.8	RC橋	旧市	1985	2020	Ⅰ	2025				
無名橋(17028)	5.2	RC橋	旧市	2014	2022	Ⅰ	2027				
白板橋	21.7	鋼橋	旧市	1962	2022	Ⅲ	2027				(架け替え)
開智橋	21.2	PC橋	旧市	1962	2022	Ⅰ	2027				
開智橋歩道橋	21.2	鋼橋	旧市	1962	2022	Ⅲ	2027			(2023)	(修繕済)
千歳橋	23.8	鋼橋	旧市	1964	2021	Ⅲ	2026	2023	2025		修繕
幸橋	21.2	鋼橋	旧市	1964	2022	Ⅱ	2027				
中の橋	21.2	鋼橋	旧市	1963	2022	Ⅰ	2027				
一つ橋	21.5	鋼橋	旧市	1963	2022	Ⅱ	2027				
鍛冶橋	22.4	PC橋	旧市	1961	2022	Ⅱ	2027				
念来寺橋	22.0	PC橋	旧市	1961	2022	Ⅱ	2027				
清水橋	29.1	PC橋	旧市	1963	2022	Ⅱ	2027				
源橋	35.4	RC橋	旧市	2014	2021	Ⅰ	2026				
元町橋	45.6	PC橋	旧市	1972	2022	Ⅰ	2027				
曙橋	47.2	PC橋	旧市	2012	2021	Ⅰ	2026				
水汲橋	59.0	PC橋	旧市	1970	2020	Ⅰ	2024				
洞橋	26.4	RC橋	旧市	1974	2020	Ⅱ	2025				
寺前橋	26.5	鋼橋	旧市	1979	2022	Ⅱ	2027				
品庄橋	23.8	RC橋	旧市	1961	2021	Ⅲ	2026	2026	2027		修繕
限山橋	25.0	鋼橋	旧市	1974	2022	Ⅲ	2027	2026	2028		修繕
鷲の巣橋	27.1	PC橋	旧市	1988	2021	Ⅲ	2026			(2021)	(修繕済)
中条橋	31.7	PC橋	旧市	1968	2020	Ⅱ	2025				
中条橋歩道橋	31.7	PC橋	旧市	1968	2020	Ⅲ	2025	2022	2024		修繕
本庄橋	41.9	PC橋	旧市	1975	2021	Ⅱ	2026				
逢初橋	34.1	PC橋	旧市	1958	2022	Ⅱ	2027				
逢初橋歩道橋	37.0	鋼橋	旧市	1996	2022	Ⅱ	2027				
薄川橋	38.4	PC橋	旧市	1993	2021	Ⅱ	2026				
石井橋	36.5	PC橋	旧市	1985	2021	Ⅱ	2026				
中林橋	42.0	PC橋	旧市	1968	2020	Ⅰ	2025				
中林橋歩道橋(上流側)	42.0	鋼橋	旧市	1981	2020	Ⅱ	2025				
中林橋歩道橋(下流側)	42.0	鋼橋	旧市	1981	2020	Ⅱ	2025				
小松橋	67.4	PC橋	旧市	1969	2021	Ⅲ	2026	2025	2027		修繕
八竜橋	40.0	PC橋	旧市	1974	2020	Ⅱ	2025				
川久保橋	35.8	PC橋	旧市	1978	2021	Ⅱ	2026				
御嶽橋	34.3	PC橋	旧市	1979	2020	Ⅱ	2025				
舟付橋	24.5	鋼橋	旧市	1972	2022	Ⅱ	2027				
一本橋	19.5	鋼橋	旧市	1982	2022	Ⅰ	2027				
斧研橋	23.7	PC橋	旧市	1983	2022	Ⅱ	2027				
山口橋	8.0	RC橋	旧市	1990	2020	Ⅲ	2025	2023	2025		修繕
原橋	32.0	鋼橋	旧市	1978	2022	Ⅱ	2027				
三城橋	21.3	鋼橋	旧市	1957	2022	Ⅱ	2027				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
新三城橋	21.2	PC橋	旧市	1957	2022	Ⅱ	2027				
天端橋	24.5	鋼橋	旧市	1967	2020	Ⅲ	2025				(規制)
扉ダム2号橋	52.6	鋼橋	旧市	1973	2023	Ⅲ	2028		2025	2027	修繕
中央大手橋	22.6	RC橋	旧市	1999	2021	Ⅱ	2026				
牛伏橋	46.0	PC橋	旧市	1982	2020	Ⅱ	2024				
下瀬黒橋	30.1	PC橋	旧市	1977	2020	Ⅱ	2025				
吾妻橋	29.0	PC橋	旧市	1978	2022	Ⅱ	2027				
矢沢橋	30.0	PC橋	旧市	1979	2022	Ⅲ	2027		2027	2028	修繕
中橋	29.1	PC橋	旧市	1978	2022	Ⅱ	2027				
牛伏上橋	30.0	PC橋	旧市	1987	2022	Ⅰ	2027				
入船橋	50.0	PC橋	旧市	1988	2021	Ⅱ	2026				
渚橋	49.0	PC橋	旧市	2017	2021	Ⅱ	2026				
大宮橋	44.7	PC橋	旧市	1980	2021	Ⅱ	2026				
松本橋	37.1	PC橋	旧市	1967	2020	Ⅰ	2025				
松本橋歩道橋	37.1	鋼橋	旧市	1973	2020	Ⅲ	2025		2022	2024	修繕
井川城橋	37.1	鋼橋	旧市	1966	2020	Ⅲ	2025		2024	2026	修繕
井川城橋歩道橋	37.3	鋼橋	旧市	1986	2020	Ⅱ	2025				
新庄橋	57.9	PC橋	旧市	1975	2023	Ⅱ	2028				
柳橋	53.7	鋼橋	旧市	2008	2022	Ⅱ	2027				
出川北橋	44.4	PC橋	旧市	1981	2021	Ⅱ	2026				
出川橋	48.9	鋼橋	旧市	1976	2021	Ⅲ	2026		2025	2026	修繕
並柳橋	39.9	PC橋	旧市	2009	2021	Ⅱ	2026				
桜橋	43.1	PC橋	旧市	1984	2020	Ⅱ	2025				
平田橋	46.1	PC橋	旧市	2013	2021	Ⅰ	2026				
百瀬橋	42.5	PC橋	旧市	1989	2020	Ⅱ	2024				
ちくま野橋	45.2	PC橋	旧市	2003	2021	Ⅱ	2026				
島橋	92.0	鋼橋	旧市	1973	2020	Ⅲ	2024				(規制)
月見橋	157.7	PC橋	旧市	1962	2020	Ⅲ	2025				(架け替え)
月見橋歩道橋	157.7	PC橋	旧市	1981	2020	Ⅲ	2025				(架け替え)
島立橋	174.0	PC橋	旧市	1972	2021	Ⅲ	2026		2024	2026	修繕
上二子橋	139.0	PC橋	旧市	1986	2021	Ⅱ	2026				
下二子橋	156.0	PC橋	旧市	1996	2021	Ⅱ	2026				
大柳橋	58.0	PC橋	旧市	1984	2021	Ⅱ	2026				
仁科橋	57.3	PC橋	旧市	1985	2021	Ⅱ	2026				
梶海渡橋	57.5	PC橋	旧市	1987	2021	Ⅱ	2026				
北荒井橋	60.0	PC橋	旧市	1990	2021	Ⅲ	2026		2027	2028	修繕
北水代橋	59.4	PC橋	旧市	1995	2021	Ⅱ	2026				
水代橋	60.0	PC橋	旧市	1996	2021	Ⅱ	2026				
野尻橋	90.2	PC橋	旧市	1971	2020	Ⅲ	2024		2024	2026	修繕
中沢橋	99.8	PC橋	旧市	1990	2021	Ⅲ	2026		2027	2028	修繕
上橋	61.3	PC橋	旧市	1972	2020	Ⅱ	2024				
鎖川橋	84.8	鋼橋	旧市	1987	2021	Ⅲ	2026		2024	2026	修繕
千国橋	57.5	PC橋	旧市	1987	2021	Ⅱ	2026				
南水代橋	101.0	鋼橋	旧市	1999	2021	Ⅱ	2026				
下水代橋	57.5	PC橋	旧市	1994	2021	Ⅱ	2026				
無名橋(19514)	5.0	RC橋	旧市	1991	2020	Ⅱ	2025				
新橋	92.4	鋼橋	旧市	1988	2021	Ⅲ	2026		2023	2025	修繕
無名橋(19521)	5.0	RC橋	旧市	2011	2022	Ⅱ	2027				
無名橋(19524)	10.0	RC橋	旧市	1988	2022	Ⅱ	2027				
無名橋(19525)	9.0	RC橋	旧市	1988	2022	Ⅰ	2027				
神戸橋	126.5	PC橋	旧市	1986	2021	Ⅱ	2026				
神戸橋分割橋	129.0	鋼橋	旧市	1978	2021	Ⅱ	2026				
沢村橋	5.0	鋼橋	四賀	1977	2023	Ⅳ	2028				(規制)
松留橋	7.1	RC橋	四賀	1975	2022	Ⅱ	2026				
会吉橋	6.8	RC橋	四賀	1968	2021	Ⅰ	2026				
槇寄上橋	5.5	RC橋	四賀	1970	2021	Ⅱ	2026				
日影橋	6.2	PC橋	四賀	1982	2022	Ⅱ	2027				
ハトヤ沢橋	5.0	鋼橋	四賀	1963	2020	Ⅱ	2025				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
入大沢橋	6.3	RC橋	四賀	1969	2020	Ⅱ	2025				
奴橋	9.6	PC橋	四賀	1997	2020	Ⅱ	2025				
沢橋	12.6	PC橋	四賀	1997	2020	Ⅱ	2025				
馬船上橋	5.3	鋼橋	四賀	1971	2021	Ⅳ	2026				(規制)
小屋沢橋	13.9	PC橋	四賀	1990	2020	Ⅱ	2025				
寺前橋	12.4	鋼橋	四賀	1996	2020	Ⅲ	2025		2023	2025	修繕
不動尊橋	12.5	PC橋	四賀	1989	2020	Ⅰ	2025				
水上橋	9.1	RC橋	四賀	1971	2020	Ⅰ	2025				
大正橋	16.4	PC橋	四賀	2011	2022	Ⅱ	2027				
下平橋	8.3	鋼橋	四賀	1975	2021	Ⅱ	2026				
駒込橋	8.2	RC橋	四賀	1978	2022	Ⅱ	2027				
上源沢橋	10.2	RC橋	四賀	2001	2020	Ⅰ	2025				
法音寺橋	31.0	PC橋	四賀	1976	2022	Ⅱ	2027				
笹沢橋	29.7	PC橋	四賀	1982	2022	Ⅰ	2027				
片方橋	25.6	鋼橋	四賀	1980	2022	Ⅱ	2027				
和合橋	30.8	鋼橋	四賀	1979	2022	Ⅱ	2027				
うつつ橋	6.9	RC橋	四賀	1971	2020	Ⅰ	2025				
中島橋	25.0	PC橋	四賀	1981	2019	Ⅱ	2024				
裏ノ田橋	6.8	鋼橋	四賀	2014	2020	Ⅰ	2025				
穴沢2号橋	6.2	RC橋	四賀	1963	2022	Ⅲ	2026		2028	2028	修繕
穴沢1号橋	8.1	RC橋	四賀	1959	2020	Ⅲ	2025			(2022)	(修繕済)
中央橋	12.6	PC橋	四賀	2000	2020	Ⅱ	2025				
四賀大橋	49.7	PC橋	四賀	2002	2023	Ⅱ	2028				
会田大橋	19.1	PC橋	四賀	1960	2022	Ⅰ	2027				
前田橋	17.0	鋼橋	四賀	1980	2019	Ⅱ	2024				
岩淵橋	18.6	PC橋	四賀	1978	2022	Ⅱ	2027				
前田下田橋	7.5	RC橋	四賀	1979	2021	Ⅱ	2026				
召田橋	16.7	RC橋	四賀	1961	2019	Ⅱ	2024				
鎮守橋	17.4	鋼橋	四賀	1978	2019	Ⅱ	2024				
長越橋	16.6	PC橋	四賀	1980	2022	Ⅲ	2027		2026	2028	修繕
天道橋	12.5	PC橋	四賀	1981	2020	Ⅱ	2025				
中島下橋	10.6	RC橋	四賀	1979	2020	Ⅱ	2025				
中島橋	8.5	PC橋	四賀	1976	2020	Ⅲ	2025		2023	2025	修繕
大久保橋	13.9	PC橋	四賀	1987	2020	Ⅱ	2025				
矢久橋	17.5	RC橋	四賀	1950	2019	Ⅳ	2024				(規制)
虚空蔵大橋	99.0	PC橋	四賀	1996	2022	Ⅱ	2027				
水上ダム橋	33.2	鋼橋	四賀	1995	2022	Ⅱ	2027				
釜蓋橋	32.8	鋼橋	四賀	1979	2022	Ⅱ	2027				
カマブタ新橋	36.6	PC橋	四賀	1990	2022	Ⅱ	2027				
明神橋	34.0	PC橋	四賀	1977	2022	Ⅱ	2027				
法音寺下橋	32.1	鋼橋	四賀	1985	2022	Ⅰ	2027				
芝原橋	5.1	RC橋	四賀	1989	2020	Ⅲ	2025			(2023)	(修繕済)
花池橋	6.5	鋼橋	四賀	1966	2022	Ⅳ	2027				(規制)
豊泉橋	12.5	RC橋	四賀	1973	2020	Ⅱ	2025				
板取橋	34.3	PC橋	四賀	1982	2019	Ⅱ	2024				
久保橋	8.6	鋼橋	四賀	1975	2020	Ⅲ	2025				(規制)
向山橋	7.5	RC橋	四賀	1973	2020	Ⅱ	2025				
矢久橋	8.6	RC橋	四賀	1970	2020	Ⅱ	2025				
梓沢橋	9.4	PC橋	四賀	1981	2021	Ⅱ	2026				
大ノ田橋	32.5	鋼橋	四賀	1979	2022	Ⅲ	2027		2025	2027	修繕
呂口橋	39.9	PC橋	四賀	1999	2021	Ⅱ	2026				
片山橋	7.2	PC橋	四賀	1976	2021	Ⅲ	2026		2026	2028	修繕
片山2号橋	7.6	RC橋	四賀	1968	2022	Ⅰ	2027				
倉掛2号橋	5.6	RC橋	四賀	1968	2021	Ⅱ	2026				
倉掛橋	6.0	RC橋	四賀	1970	2021	Ⅱ	2025				
保福寺橋	31.5	PC橋	四賀	1998	2021	Ⅱ	2025				
穴沢橋	8.1	RC橋	四賀	1959	2021	Ⅱ	2025				
下宮前橋	7.4	鋼橋	四賀	1966	2021	Ⅱ	2025				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
中宮前橋	8.0	鋼橋	四賀	1967	2021	Ⅱ	2025				
大沢橋	9.4	PC橋	四賀	1976	2021	Ⅰ	2025				
上大沢橋	10.9	RC橋	四賀	1991	2021	Ⅱ	2025				
大沢上橋	11.2	RC橋	四賀	1981	2021	Ⅱ	2025				
入ノ沢1号橋	5.1	RC橋	四賀	1969	2020	Ⅱ	2025				
沢屋橋	23.3	鋼橋	四賀	1980	2022	Ⅱ	2027				
青木橋	22.0	鋼橋	四賀	1982	2022	Ⅱ	2027				
下小井戸橋	5.9	RC橋	四賀	1965	2021	Ⅱ	2026				
小井戸橋	6.8	RC橋	四賀	1972	2020	Ⅱ	2025				
中入橋	6.9	RC橋	四賀	1975	2021	Ⅱ	2026				
上宮前橋	5.7	鋼橋	四賀	1967	2021	Ⅲ	2025				(規制)
入ノ沢2号橋	5.0	RC橋	四賀	1969	2021	Ⅱ	2026				
入ノ沢3号橋	5.5	RC橋	四賀	1969	2022	Ⅱ	2027				
クルマ橋	18.9	PC橋	四賀	1976	2022	Ⅲ	2027		2026	2028	修繕
矢満田橋	20.9	鋼橋	四賀	1980	2022	Ⅱ	2027				
向田橋	5.2	RC橋	四賀	1968	2022	Ⅱ	2027				
みそ入橋	6.5	鋼橋	四賀	1962	2021	Ⅱ	2026				
小屋老橋	5.6	RC橋	四賀	1981	2021	Ⅱ	2026				
中田橋	5.4	RC橋	四賀	1989	2022	Ⅰ	2027				
太の田上橋	5.2	RC橋	四賀	1971	2021	Ⅱ	2026				
矢室旧道橋	5.7	鋼橋	四賀	1965	2022	Ⅱ	2027				
向山橋	18.8	PC橋	四賀	1978	2022	Ⅲ	2027		2026	2028	修繕
下小瀬橋	19.4	鋼橋	四賀	1978	2022	Ⅱ	2027				
淀ヶ沢橋	18.4	鋼橋	四賀	1974	2022	Ⅳ	2027		2023	2026	更新
淀ヶ沢上橋	6.1	RC橋	四賀	1971	2021	Ⅰ	2026				
中木戸橋	20.6	PC橋	四賀	1973	2022	Ⅱ	2027				
無名橋(20119)	20.0	鋼橋	四賀	1974	2023	Ⅲ	2028				(規制)
無名橋(20120)	5.3	鋼橋	四賀	1968	2022	Ⅱ	2027				
三ツ屋橋	16.6	PC橋	四賀	1980	2022	Ⅲ	2027		2026	2027	修繕
金山橋	20.5	鋼橋	四賀	1974	2022	Ⅱ	2027				
上金山橋	16.6	鋼橋	四賀	1978	2022	Ⅱ	2027				
滝ノ沢橋	7.0	RC橋	四賀	1981	2021	Ⅱ	2026				
分校口橋	19.2	鋼橋	四賀	1973	2022	Ⅱ	2027				
押ヶ沢上橋	7.3	鋼橋	四賀	1965	2020	Ⅱ	2025				
寺前橋	17.1	PC橋	四賀	1968	2022	Ⅰ	2027				
太の田下橋	6.1	PC橋	四賀	1970	2021	Ⅱ	2026				
押ヶ沢橋	8.0	PC橋	四賀	1984	2020	Ⅰ	2025				
月沢上橋	6.0	RC橋	四賀	1980	2022	Ⅱ	2027				
月沢橋	18.1	RC橋	四賀	1965	2021	Ⅲ	2026			(2022)	(修繕済)
山口橋	8.6	PC橋	四賀	1982	2022	Ⅱ	2026				
勝立橋	10.3	RC橋	四賀	1973	2021	Ⅰ	2026				
島々谷1号橋	7.6	鋼橋	安曇	1981	2021	Ⅱ	2026				
島々谷2号橋	17.4	鋼橋	安曇	1965	2019	Ⅲ	2024				(規制)
島々谷3号橋	6.3	PC橋	安曇	1981	2020	Ⅱ	2025				
島々谷4号橋	11.8	鋼橋	安曇	1981	2021	Ⅲ	2026				(規制)
島々谷5号橋	21.0	鋼橋	安曇	1965	2019	Ⅳ	2024				(規制)
雑炊橋	39.6	PC橋	安曇	1987	2019	Ⅱ	2024				
島々橋	23.4	RC橋	安曇	1954	2019	Ⅲ	2024			(2020)	(修繕済)
島々橋分割橋	23.4	鋼橋	安曇	1954	2019	Ⅲ	2024			(2023)	(修繕済)
稻核橋	48.5	鋼橋	安曇	1965	2023	Ⅲ	2028				(規制)
稻核ダム橋	40.3	鋼橋	安曇	1965	2019	Ⅲ	2024		2023	2027	修繕
五島沢橋	20.6	鋼橋	安曇	1965	2019	Ⅲ	2024		2023	2027	修繕
笑沢橋	21.5	鋼橋	安曇	1965	2019	Ⅲ	2024			(2022)	(修繕済)
板沢橋	21.0	鋼橋	安曇	1973	2023	Ⅱ	2028				
湯川1号橋	49.1	鋼橋	安曇	1935	2019	Ⅳ	2024				(架け替え)
沢渡橋	43.0	鋼橋	安曇	1997	2019	Ⅲ	2024		2023	2024	修繕
霞橋	13.9	RC橋	安曇	1935	2021	Ⅲ	2026				(規制)
湯川2号橋	27.4	鋼橋	安曇	1969	2019	Ⅲ	2024			(2021)	(修繕済)

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容
沢渡1号橋	35.0	鋼橋	安曇	1957	2019	Ⅱ	2024				
ワサビ沢1号橋	12.9	PC橋	安曇	1974	2021	Ⅰ	2026				
ワサビ沢2号橋	13.1	鋼橋	安曇	1974	2021	Ⅲ	2026			(2021)	(修繕済)
霞沢橋	66.0	鋼橋	安曇	2014	2021	Ⅱ	2026				
おこがさ橋	24.2	鋼橋	奈川	2002	2023	Ⅰ	2027				
宮橋	36.1	鋼橋	奈川	2001	2023	Ⅱ	2027				
和手橋	32.8	鋼橋	奈川	1967	2023	Ⅲ	2027		2025	2027	修繕
瀬戸河原橋	26.1	鋼橋	奈川	1968	2023	Ⅱ	2027				
魚イラス橋	12.0	鋼橋	奈川	1950	2021	Ⅱ	2026				
久手橋	28.0	鋼橋	奈川	1985	2023	Ⅱ	2027				
久手二号橋	29.7	PC橋	奈川	1990	2023	Ⅰ	2027				
学童橋	31.0	鋼橋	奈川	1985	2023	Ⅱ	2027				
大平橋	28.9	鋼橋	奈川	1967	2023	Ⅲ	2027		2025	2027	修繕
曾倉沢橋	6.8	RC橋	奈川	1963	2021	Ⅱ	2026				
大橋	36.9	鋼橋	奈川	1982	2023	Ⅱ	2027				
無名橋(40018)	5.9	RC橋	奈川	1983	2021	Ⅱ	2026				
黒川渡橋	37.0	鋼橋	奈川	1985	2023	Ⅱ	2027				
黒川渡橋歩道橋	39.5	鋼橋	奈川	2010	2022	Ⅱ	2027				
新小山橋	35.0	鋼橋	奈川	2006	2021	Ⅱ	2026				
小黒川橋	13.0	PC橋	奈川	1993	2021	Ⅱ	2026				
湯橋	24.0	鋼橋	奈川	1966	2023	Ⅱ	2027				
二の瀬橋	22.6	鋼橋	奈川	1999	2023	Ⅲ	2027		2026	2027	修繕
渚ノ尻橋	16.8	鋼橋	奈川	1982	2022	Ⅱ	2027				
下島2号橋	19.0	PC橋	奈川	1978	2022	Ⅲ	2027		2020	2024	修繕
駒ヶ原橋	6.0	RC橋	奈川	1969	2021	Ⅱ	2026				
山の神橋	18.2	鋼橋	奈川	1989	2023	Ⅱ	2027				
高橋	10.5	PC橋	奈川	1966	2021	Ⅱ	2026				
細沢橋	10.5	鋼橋	奈川	1943	2021	Ⅲ	2026			(2023)	(修繕済)
下島1号橋	17.5	鋼橋	奈川	1969	2021	Ⅲ	2026		2027	2028	修繕
万年橋	105.6	吊橋	奈川	1969	2022	Ⅲ	2027		2022	2026	修繕
深沢橋	6.6	RC橋	奈川	1951	2021	Ⅱ	2026				
大白川橋	13.6	鋼橋	奈川	1951	2021	Ⅰ	2026				
無名橋(40036)	9.2	PC橋	奈川	1992	2021	Ⅰ	2026				
大平新橋	38.1	PC橋	奈川	1998	2023	Ⅰ	2028				
無名橋(40038)	19.0	鋼橋	奈川	1964	2023	Ⅲ	2028		2026	2027	修繕
正沢大橋	137.0	鋼橋	奈川	1997	2022	Ⅲ	2027		2024	2025	修繕
夢の森大橋	180.0	鋼橋	奈川	2000	2022	Ⅱ	2027				
板の木橋	71.2	鋼橋	奈川	2000	2023	Ⅱ	2028				
雪見ヶ原橋	134.0	PC橋	奈川	1999	2022	Ⅱ	2027				
小山橋	16.5	鋼橋	奈川	1966	2023	Ⅲ	2028		2025	2027	修繕
梓川4号橋	9.3	RC橋	梓川	1977	2021	Ⅱ	2026				
梓川6号橋	7.8	RC橋	梓川	1977	2021	Ⅰ	2026				
梓川7号橋	7.3	RC橋	梓川	1977	2021	Ⅱ	2026				
梓川15号橋	6.5	RC橋	梓川	1976	2021	Ⅰ	2026				
梓川17号橋	6.3	PC橋	梓川	1970	2022	Ⅲ	2026			(2023)	(修繕済)
梓川21号橋	8.0	PC橋	梓川	1975	2021	Ⅲ	2026			(2023)	(修繕済)
梓川22号橋	6.9	PC橋	梓川	1977	2021	Ⅲ	2026			(2023)	(修繕済)
梓川28号橋	5.8	PC橋	梓川	1981	2022	Ⅱ	2027				
梓川29号橋	7.3	PC橋	梓川	1974	2022	Ⅰ	2027				
梓川38号橋	24.8	RC橋	梓川	1978	2019	Ⅲ	2024			(2022)	(修繕済)
梓川45号橋	6.5	RC橋	梓川	1984	2022	Ⅰ	2027				
梓川46号橋	7.2	鋼橋	梓川	1984	2022	Ⅱ	2027				
梓川51号橋	7.2	PC橋	梓川	1970	2022	Ⅲ	2026		2020	2024	修繕
梓川52号橋	7.2	PC橋	梓川	1970	2021	Ⅱ	2026				
梓川61号橋	8.7	PC橋	梓川	1977	2021	Ⅱ	2026				
梓川71号橋	6.9	PC橋	梓川	1978	2022	Ⅱ	2027				
梓川73号橋	6.3	PC橋	梓川	1978	2022	Ⅲ	2027		2025	2027	修繕
梓川75号橋	8.5	PC橋	梓川	1977	2021	Ⅰ	2026				

非
公
開

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

橋長5m以上の車道橋・併設歩道橋

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了	対策内容	
梓川81号橋	7.9	RC橋	梓川	1988	2021	Ⅱ	2026	非 公 開				
梓川90号橋	5.9	PC橋	梓川	1981	2021	Ⅱ	2026					
梓川98号橋	6.7	RC橋	梓川	1977	2021	Ⅱ	2026					
梓川105号橋	8.6	PC橋	梓川	1985	2022	Ⅰ	2027					
梓川106号橋	6.7	RC橋	梓川	1986	2021	Ⅰ	2026					
梓川110号橋	6.7	PC橋	梓川	1971	2021	Ⅱ	2026					
梓川112号橋	8.4	PC橋	梓川	1989	2021	Ⅰ	2026					
梓川113号橋	9.0	PC橋	梓川	1985	2021	Ⅰ	2026					
梓川114号橋	11.7	RC橋	梓川	1990	2021	Ⅰ	2026					
梓川115号橋	8.4	PC橋	梓川	1977	2022	Ⅱ	2027					
梓川116号橋	7.0	RC橋	梓川	1972	2021	Ⅲ	2026				(規制)	
梓川121号橋	7.4	PC橋	梓川	1985	2021	Ⅱ	2026					
梓川122号橋	10.1	PC橋	梓川	1998	2021	Ⅱ	2026					
001号橋	5.9	PC橋	波田	1972	2022	Ⅲ	2027			2025	2027	修繕
003号橋	5.8	RC橋	波田	1972	2022	Ⅰ	2027					
009号橋	12.9	RC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
012号橋	5.8	PC橋	波田	1972	2022	Ⅲ	2027			2025	2026	修繕
018号橋	5.8	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
024号橋	5.8	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
026号橋	6.0	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
032号橋	8.4	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
034号橋	11.5	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
035号橋	5.8	PC橋	波田	1972	2022	Ⅱ	2027					
037号橋	5.7	RC橋	波田	1990	2022	Ⅱ	2027					
054号橋	10.6	PC橋	波田	1994	2021	Ⅰ	2026					
055号橋	9.0	PC橋	波田	1972	2021	Ⅲ	2026			2027	2028	修繕
056号橋	8.8	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
057号橋	8.3	鋼橋	波田	1972	2022	Ⅲ	2027			2025	2026	修繕
058号橋	7.3	PC橋	波田	1972	2021	Ⅰ	2026					
059号橋	8.4	RC橋	波田	2016	2021	Ⅰ	2026					
068号橋	7.8	RC橋	波田	1972	2022	Ⅲ	2027			2027	2028	修繕
071号橋	5.3	鋼橋	波田	1980	2022	Ⅱ	2027					
077号橋	9.0	PC橋	波田	1972	2021	Ⅱ	2026					
竜安橋	65.8	鋼橋	波田	1966	2019	Ⅲ	2024		2023	2026	修繕	
080号橋	14.0	鋼橋	波田	1984	2021	Ⅰ	2026					
084号橋	15.4	PC橋	波田	2015	2021	Ⅰ	2026					
087号橋	7.6	PC橋	波田	1989	2022	Ⅰ	2027					
089号橋	5.3	RC橋	波田	1984	2021	Ⅰ	2026					
091号橋	6.2	RC橋	波田	1972	2022	Ⅰ	2027					
107号橋	7.6	鋼橋	波田	1972	2022	Ⅲ	2027		2025	2026	修繕	
108号橋	11.5	PC橋	波田	1972	2022	Ⅱ	2027					

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋 (12001)	3.6	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
無名橋 (12002)	2.6	RC橋	旧市	1996	2020	II	2024				
無名橋 (12003)	2.3	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (12004)	4.0	BOX	旧市	1996	2019	II	2024				
無名橋 (12005)	3.6	RC橋	旧市	1993	2022	II	2026				
無名橋 (12007)	2.6	RC橋	旧市	不明	2020	I	2024				
無名橋 (12008)	2.4	BOX	旧市	不明	2020	I	2024				
無名橋 (12009)	4.4	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
無名橋 (12011)	2.5	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (12012)	3.0	BOX	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (12066)	2.6	RC橋	旧市	1988	2020	II	2024				
無名橋 (13009)	2.7	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13010)	2.7	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13012)	4.0	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
北方橋	4.2	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13015)	2.6	BOX	旧市	1996	2022	II	2027				
無名橋 (13017)	4.0	BOX	旧市	1991	2022	I	2027				
無名橋 (13019)	4.0	BOX	旧市	1983	2022	I	2027				
無名橋 (13020)	4.1	BOX	旧市	不明	2022	I	2027				
無名橋 (13021)	3.2	RC橋	旧市	不明	2020	III	2024		(2022)	(修繕済)	
無名橋 (13024)	2.0	BOX	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13026)	3.0	BOX	旧市	1985	2020	II	2025				
つきり橋	4.2	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13028)	4.5	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13033)	3.5	RC橋	旧市	不明	2020	III	2025		(2022)	(修繕済)	
無名橋 (13035)	4.9	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
西大門沢橋	3.2	RC橋	旧市	1967	2022	II	2027	非			
無名橋 (13038)	3.8	RC橋	旧市	不明	2023	II	2027	公			
旗町橋	4.4	RC橋	旧市	1971	2022	II	2027	開			
無名橋 (13040)	2.5	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024		2025	2025	修繕
無名橋 (13041)	3.5	BOX	旧市	不明	2020	III	2025				
無名橋 (13042)	3.2	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13045)	4.5	鋼橋	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13046)	2.5	RC橋	旧市	2005	2019	II	2024				
無名橋 (13047)	3.3	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13048)	3.1	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13050)	4.7	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13051)	2.6	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13055)	4.3	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13056)	5.0	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13057)	2.6	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13058)	3.1	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13060)	2.4	BOX	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13061)	3.3	RC橋	旧市	不明	2020	III	2024		(2021)	(修繕済)	
無名橋 (13063)	4.8	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13065)	2.6	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13066)	3.7	RC橋	旧市	不明	2020	I	2024				
無名橋 (13067)	3.5	RC橋	旧市	1993	2020	II	2025				
無名橋 (13068)	3.1	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
下金井二号橋	3.2	RC橋	旧市	1978	2020	II	2025				
無名橋 (13070)	4.0	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
無名橋 (13071)	2.7	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13072)	4.1	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13075)	2.0	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13076)	2.7	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13077)	2.3	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13079)	2.4	RC橋	旧市	不明	2020	II	2024				

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、()書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋 (13080)	2.1	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (13084)	2.7	BOX	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13085)	4.0	BOX	旧市	不明	2020	II	2024				
無名橋 (13086)	2.3	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
無名橋 (13087)	2.7	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
無名橋 (13088)	2.6	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
無名橋 (13090)	2.1	RC橋	旧市	不明	2020	II	2025				
南浅間橋	46.8	鋼橋	旧市	1989	2022	III	2026		2028	2028	修繕
無名橋 (13093)	4.0	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13094)	2.8	RC橋	旧市	1993	2020	II	2025				
無名橋 (13096)	3.0	BOX	旧市	1993	2019	II	2024				
無名橋 (13097)	2.3	BOX	旧市	1996	2019	II	2024				
無名橋 (13099)	2.0	BOX	旧市	1997	2019	II	2024				
無名橋 (13101)	5.4	鋼橋	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (13103)	5.0	BOX	旧市	1997	2020	II	2025				
無名橋 (13104)	3.0	BOX	旧市	1997	2022	II	2027				
無名橋 (13105)	2.0	BOX	旧市	1999	2019	II	2024				
無名橋(13107)	2.2	BOX	旧市	2020	2023	I	2024				
無名橋(13108)	2.1	BOX	旧市	2021	2023	I	2025				
無名橋 (14001)	3.6	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (14003)	3.3	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (14006)	3.3	BOX	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14007)	4.8	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14008)	4.1	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (14012)	3.0	RC橋	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (14013)	3.1	RC橋	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (14016)	2.9	RC橋	旧市	1989	2022	II	2027				
無名橋 (14018)	3.5	RC橋	旧市	1986	2022	II	2026				
栗林堰橋	3.5	BOX	旧市	1989	2022	I	2026				
無名橋 (14025)	2.5	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14028)	2.7	RC橋	旧市	1989	2022	II	2026				
無名橋 (14029)	3.0	RC橋	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14032)	2.6	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
小宮橋	3.7	RC橋	旧市	1969	2022	III	2026		2026	2026	修繕
無名橋 (14037)	2.2	RC橋	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14038)	3.0	RC橋	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14039)	2.9	RC橋	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14040)	4.0	RC橋	旧市	不明	2021	III	2025			(2022)	(修繕済)
無名橋 (14044)	2.4	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (14045)	2.6	RC橋	旧市	不明	2021	I	2025				
無名橋 (14047)	2.0	BOX	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14049)	2.1	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14050)	4.2	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14051)	2.0	BOX	旧市	2005	2019	II	2024				
無名橋 (14053)	2.9	RC橋	旧市	1983	2021	II	2025				
無名橋 (14058)	2.3	RC橋	旧市	不明	2019	III	2024		2027	2027	修繕
無名橋 (14071)	3.3	BOX	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14074)	3.6	BOX	旧市	不明	2022	II	2026				
川向橋	3.0	BOX	旧市	1982	2019	II	2024				
観音橋	3.0	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (14078)	3.0	BOX	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14081)	3.0	BOX	旧市	不明	2023	II	2027				
無名橋 (14082)	4.3	RC橋	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (14085)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14086)	3.0	BOX	旧市	1996	2019	II	2024				
無名橋 (14087)	4.5	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (14089)	2.8	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (14090)	2.2	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、()書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋 (14093)	5.3	鋼橋	旧市	不明	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14095)	3.2	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14096)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
袖留橋	5.4	BOX	旧市	2005	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14099)	4.4	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14102)	4.1	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14104)	4.3	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14105)	3.8	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14107)	7.3	RC橋	旧市	不明	2023	Ⅰ	2027				
無名橋 (14111)	3.1	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14113)	3.6	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14114)	3.9	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14115)	4.4	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14116)	2.8	RC橋	旧市	不明	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14117)	3.7	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅲ	2025			(2021)	(修繕済)
徒土橋	4.7	RC橋	旧市	1957	2023	Ⅱ	2027				
城西橋	4.8	BOX	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14128)	4.3	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14129)	3.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅲ	2025			(2021)	(修繕済)
小島橋	4.3	RC橋	旧市	1960	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14137)	3.2	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14141)	4.7	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅲ	2025		2025	2025	修繕
無名橋 (14142)	2.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14144)	2.1	BOX	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14145)	2.0	BOX	旧市	不明	2020	Ⅱ	2024				
無名橋 (14146)	4.1	RC橋	旧市	不明	2020	Ⅱ	2024				
無名橋 (14147)	3.4	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅲ	2025		2026	2026	修繕
無名橋 (14148)	3.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅲ	2025			(2021)	(修繕済)
梅ヶ枝橋	3.7	RC橋	旧市	1970	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14150)	3.6	BOX	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14154)	2.5	BOX	旧市	不明	2019	Ⅲ	2024			(2023)	(修繕済)
無名橋 (14155)	6.4	BOX	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14161)	4.4	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14164)	3.1	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅲ	2025			(2023)	(修繕済)
無名橋 (14165)	2.3	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
下金井上橋	4.1	RC橋	旧市	1985	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14168)	3.2	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14169)	4.5	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14170)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14172)	2.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14177)	4.7	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14179)	4.8	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14180)	2.5	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14187)	4.6	RC橋	旧市	不明	2023	Ⅲ	2027		2028	2028	修繕
無名橋 (14199)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14200)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14201)	2.6	RC橋	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14204)	3.8	RC橋	旧市	不明	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14207)	4.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14208)	4.1	RC橋	旧市	1983	2023	Ⅲ	2027		2025	2025	修繕
無名橋 (14212)	3.5	BOX	旧市	1985	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14216)	4.4	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14217)	4.5	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14218)	2.5	RC橋	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14219)	2.0	RC橋	旧市	1987	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14220)	3.0	BOX	旧市	1987	2022	Ⅰ	2026				
無名橋 (14221)	2.4	BOX	旧市	不明	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14222)	4.5	RC橋	旧市	1987	2021	Ⅱ	2025				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋 (14223)	4.0	RC橋	旧市	1987	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14225)	2.0	BOX	旧市	1991	2019	Ⅱ	2024				
見晴橋	76.0	鋼橋	旧市	1991	2022	Ⅱ	2026				
荒井橋	6.0	BOX	旧市	2005	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14229)	2.1	BOX	旧市	1988	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14231)	3.5	RC橋	旧市	1988	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14234)	3.2	BOX	旧市	1992	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14235)	4.0	BOX	旧市	1993	2022	Ⅱ	2026				
元女橋	45.5	PC橋	旧市	1994	2022	Ⅱ	2027				
無名橋 (14241)	10.5	BOX	旧市	1987	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14242)	4.0	RC橋	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14243)	3.7	RC橋	旧市	1990	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14244)	2.0	BOX	旧市	1986	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14245)	2.5	BOX	旧市	不明	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14246)	2.5	BOX	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (14247)	2.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14248)	2.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14249)	3.5	RC橋	旧市	1996	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14253)	2.5	BOX	旧市	2001	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14254)	2.5	BOX	旧市	2001	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14256)	3.0	BOX	旧市	2003	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14257)	8.0	BOX	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (14258)	5.4	BOX	旧市	不明	2021	Ⅰ	2025				
無名橋 (14259)	5.7	BOX	旧市	2007	2021	Ⅰ	2025				
無名橋 (14260)	3.6	BOX	旧市	2007	2021	Ⅲ	2025		2027	2027	修繕
無名橋 (14261)	3.0	BOX	旧市	不明	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (14262)	3.2	BOX	旧市	2007	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14263)	2.3	BOX	旧市	2007	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14264)	3.7	BOX	旧市	2007	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14265)	5.0	BOX	旧市	2007	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14266)	5.0	BOX	旧市	2007	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14267)	3.0	BOX	旧市	2007	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (14269)	2.1	BOX	旧市	2012	2019	Ⅰ	2024				
無名橋 (14273)	2.4	BOX	旧市	2018	2023	Ⅰ	2027				
無名橋(14274)	3.2	BOX	旧市	2018	2023	Ⅰ	2027				
無名橋(14275)	3.2	BOX	旧市	2018	2023	Ⅰ	2027				
無名橋(14276)	2.1	BOX	旧市	2022	2023	Ⅰ	2026				
無名橋 (15001)	3.6	RC橋	旧市	1989	2023	Ⅱ	2027				
無名橋 (15002)	2.5	RC橋	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15004)	3.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15007)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15008)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15009)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15010)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15011)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15012)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15013)	5.0	BOX	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15014)	4.3	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (15019)	2.2	RC橋	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15020)	2.2	RC橋	旧市	不明	2019	Ⅱ	2024				
無名橋 (15021)	2.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (15022)	4.2	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (15025)	3.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (15026)	4.7	RC橋	旧市	1971	2022	Ⅲ	2026		2028	2028	修繕
無名橋 (15028)	2.2	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				
無名橋 (15029)	3.3	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (15030)	4.5	RC橋	旧市	不明	2022	Ⅱ	2026				
無名橋 (15031)	3.0	RC橋	旧市	不明	2021	Ⅱ	2025				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、()書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋 (15034)	4.0	RC橋	旧市	不明	2023	I	2027				
無名橋 (15039)	2.3	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (15040)	4.2	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15041)	2.6	RC橋	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (15043)	2.7	RC橋	旧市	不明	2021	III	2025		2025	2025	修繕
無名橋 (15044)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	III	2025			(2022)	(修繕済)
無名橋 (15051)	2.0	BOX	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15052)	2.1	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15053)	2.0	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15054)	2.4	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15057)	2.6	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15068)	4.3	RC橋	旧市	1996	2021	II	2026				
無名橋 (15070)	2.0	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15072)	2.1	RC橋	旧市	不明	2021	III	2025			(2023)	(修繕済)
無名橋 (15073)	2.3	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15078)	3.6	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15080)	3.0	BOX	旧市	1993	2019	II	2024				
無名橋 (15081)	3.7	RC橋	旧市	不明	2022	I	2026				
無名橋 (15082)	2.2	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15083)	2.6	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15084)	2.1	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15091)	4.0	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15094)	3.0	RC橋	旧市	不明	2023	II	2027				
無名橋 (15102)	2.6	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (15103)	2.4	RC橋	旧市	1983	2021	II	2025				
無名橋 (15104)	4.1	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15113)	3.7	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15115)	4.0	RC橋	旧市	不明	2023	II	2027				
無名橋 (15116)	3.2	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (15119)	2.5	BOX	旧市	不明	2021	II	2026				
泉橋	13.3	BOX	旧市	2008	2022	I	2027				
無名橋 (15144)	3.2	BOX	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15147)	2.0	RC橋	旧市	不明	2021	II	2025				
無名橋 (15148)	2.1	RC橋	旧市	1985	2021	II	2026				
無名橋 (15151)	4.1	BOX	旧市	1987	2021	II	2026				
無名橋 (15152)	2.7	BOX	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15153)	2.8	RC橋	旧市	1991	2022	II	2026				
無名橋 (15154)	5.0	BOX	旧市	1992	2021	II	2026				
無名橋 (15159)	2.4	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (15160)	4.6	BOX	旧市	1992	2019	II	2024				
無名橋 (15162)	2.5	RC橋	旧市	1996	2019	I	2024				
無名橋 (15163)	2.3	BOX	旧市	1997	2021	II	2025				
無名橋 (15165)	4.0	RC橋	旧市	1998	2021	II	2026				
無名橋 (15169)	2.4	RC橋	旧市	2003	2022	II	2026				
無名橋 (15170)	2.7	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
竹刈橋	36.5	鋼橋	旧市	不明	2022	II	2026				
無名橋 (15172)	2.1	BOX	旧市	不明	2019	I	2024				
無名橋 (16004)	3.7	BOX	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16005)	3.8	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16009)	3.5	BOX	旧市	不明	2019	II	2024				
無名橋 (16024)	2.3	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16025)	2.3	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16026)	2.3	BOX	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16030)	4.7	RC橋	旧市	1983	2021	I	2026				
無名橋 (16031)	3.4	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16033)	2.1	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16034)	3.8	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16050)	2.5	BOX	旧市	1993	2021	I	2026				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋 (16052)	4.2	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16053)	2.8	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16055)	4.2	RC橋	旧市	不明	2021	I	2026				
無名橋 (16067)	4.6	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16070)	2.3	BOX	旧市	不明	2021	I	2026				
無名橋 (16077)	2.2	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16080)	2.3	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (16082)	2.8	RC橋	旧市	2000	2021	II	2026				
無名橋 (16083)	4.0	RC橋	旧市	不明	2021	I	2026				
無名橋 (16084)	2.8	RC橋	旧市	2000	2021	II	2026				
無名橋 (16085)	2.8	RC橋	旧市	2000	2021	II	2026				
無名橋(16089)	2.1	RC橋	旧市	不明	2023	II	2027				
無名橋 (17001)	2.8	RC橋	旧市	不明	2022	III	2026		2028	2028	修繕
無名橋 (17003)	2.5	BOX	旧市	不明	2022	I	2026				
無名橋 (17004)	3.5	RC橋	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (17005)	4.3	RC橋	旧市	不明	2021	I	2026				
無名橋 (17011)	2.0	RC橋	旧市	不明	2023	II	2027				
無名橋 (17012)	3.3	RC橋	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (17013)	2.2	RC橋	旧市	不明	2022	II	2027				
無名橋 (17015)	4.0	BOX	旧市	不明	2021	II	2026				
無名橋 (17021)	4.3	RC橋	旧市	2000	2022	II	2027				
無名橋 (17026)	4.0	RC橋	旧市	2007	2023	II	2027				
内田山橋	4.9	PC橋	旧市	2008	2023	I	2027				
無名橋 (17029)	5.0	BOX	旧市	2000	2023	II	2027				
旭橋	45.4	鋼橋	旧市	1988	2022	II	2027				
舟付橋福祉橋	16.4	鋼橋	旧市	1993	2022	II	2027				
ヨウスイ橋	3.4	RC橋	旧市	不明	2023	II	2027				
青島橋	5.3	BOX	旧市	不明	2022	II	2027				
ヨロイ橋	4.0	鋼橋	旧市	2011	2021	II	2026				
ヒラセセキ橋	2.0	RC橋	旧市	2011	2021	II	2026				
ハバタ橋	2.8	RC橋	旧市	2011	2021	III	2026		2026	2026	修繕
無名橋 (19522)	2.0	BOX	旧市	2011	2023	II	2027				
無名橋 (19523)	2.0	BOX	旧市	2011	2019	II	2024				
芳川用水橋	4.2	RC橋	旧市	2012	2021	II	2026				
無名橋 (19529)	2.9	RC橋	旧市	2012	2021	II	2026				
無名橋 (19530)	3.4	BOX	旧市	2015	2023	II	2027				
槇寄橋	4.8	RC橋	四賀	1971	2022	II	2027				
両瀬3号橋	2.9	鋼橋	四賀	1966	2022	II	2027				
無名橋 (20026)	3.9	BOX	四賀	1982	2022	II	2027				
知見寺下橋	2.0	BOX	四賀	1988	2022	II	2027				
両瀬1号橋	2.5	BOX	四賀	1972	2023	II	2027				
無名橋 (20059)	3.2	RC橋	四賀	1974	2023	I	2027				
中橋	4.8	鋼橋	四賀	1976	2023	II	2027				
蝮沢橋	4.2	RC橋	四賀	1980	2023	I	2027				
宮ノ前橋	3.7	鋼橋	四賀	1993	2023	II	2027				
宮前橋	4.9	RC橋	四賀	1980	2021	II	2026				
下中林橋	6.9	その他	四賀	不明	2023	III	2027		2027	2027	更新
無名橋 (20106)	4.4	BOX	四賀	1982	2022	II	2027				
白張橋	4.0	鋼橋	四賀	1979	2023	III	2027		2028	2028	修繕
上刈谷原橋	4.1	RC橋	四賀	1970	2021	II	2026				
和平橋	3.6	BOX	四賀	1993	2023	II	2027				
花見橋	3.3	鋼橋	四賀	1989	2023	II	2027				
無名橋 (20130)	2.8	RC橋	四賀	不明	2023	I	2027				
津島橋	3.8	鋼橋	四賀	1977	2023	II	2027				
与助谷橋	3.7	RC橋	四賀	1969	2021	II	2026				
久手地沢橋	3.9	BOX	四賀	2018	2023	II	2027				
上手河原橋	27.2	鋼橋	安曇	不明	2022	II	2027				
宮の沢橋	4.6	RC橋	安曇	1979	2022	II	2027				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
無名橋(30019)	2.4	BOX	安曇	1973	2023	I	2027				
無名橋(30022)	3.7	RC橋	安曇	1978	2023	II	2027				
桧峠橋	24.6	鋼橋	安曇	不明	2023	IV	2027				(規制)
檜の木橋	16.7	鋼橋	安曇	不明	2023	II	2027				
祠峠橋	25.5	鋼橋	安曇	1973	2022	II	2027				
無名橋(30037)	2.6	RC橋	安曇	1982	2023	II	2027				
無名橋(30038)	4.0	BOX	安曇	2014	2023	II	2027				
無名橋(40030)	3.2	RC橋	奈川	1981	2023	II	2027				
梓川2号橋	4.5	BOX	梓川	1982	2020	II	2025				
梓川3号橋	4.4	BOX	梓川	1982	2021	II	2026				
梓川5号橋	2.1	RC橋	梓川	1992	2019	II	2024				
梓川8号橋	3.0	BOX	梓川	1989	2021	II	2026				
梓川9号橋	2.1	BOX	梓川	1993	2019	II	2024				
梓川10号橋	2.2	RC橋	梓川	1983	2021	II	2026				
梓川11号橋	4.0	RC橋	梓川	1990	2021	II	2026				
梓川12号橋	4.8	BOX	梓川	1983	2021	II	2026				
梓川14号橋	3.5	RC橋	梓川	1983	2021	II	2026				
梓川16号橋	2.5	BOX	梓川	1998	2021	II	2026				
梓川18号橋	2.1	BOX	梓川	1984	2019	II	2024				
梓川20号橋	4.0	RC橋	梓川	1980	2021	II	2026				
梓川24号橋	2.5	RC橋	梓川	1993	2019	II	2024				
梓川25号橋	2.4	BOX	梓川	1993	2019	II	2024				
梓川26号橋	2.9	BOX	梓川	1983	2019	II	2024				
梓川27号橋	30.4	RC橋	梓川	不明	2022	II	2027				
梓川30号橋	3.6	RC橋	梓川	1980	2020	II	2025				
梓川31号橋	3.6	RC橋	梓川	1980	2020	II	2025				
梓川33号橋	3.3	RC橋	梓川	1979	2021	II	2026				
梓川34号橋	4.4	BOX	梓川	2001	2019	II	2024				
梓川35号橋	7.3	BOX	梓川	不明	2019	II	2024				
梓川36号橋	2.6	RC橋	梓川	1984	2019	II	2024				
梓川37号橋	2.3	RC橋	梓川	1973	2020	II	2025				
梓川39号橋	2.3	RC橋	梓川	1969	2020	II	2025				
梓川40号橋	3.9	RC橋	梓川	1973	2021	II	2026				
梓川41号橋	4.0	BOX	梓川	1973	2020	II	2025				
梓川42号橋	3.7	BOX	梓川	1980	2020	II	2025				
梓川43号橋	3.3	BOX	梓川	1980	2021	II	2026				
梓川44号橋	3.7	BOX	梓川	1980	2021	II	2026				
梓川47号橋	4.6	BOX	梓川	1982	2019	II	2024				
梓川48号橋	3.5	RC橋	梓川	1979	2021	II	2026				
梓川49号橋	2.1	BOX	梓川	1979	2019	II	2024				
梓川50号橋	3.2	BOX	梓川	1982	2021	III	2026			(2022)	(修繕済)
梓川54号橋	2.6	RC橋	梓川	1969	2020	II	2025				
梓川55号橋	2.2	RC橋	梓川	1972	2019	II	2024				
梓川56号橋	3.6	BOX	梓川	1978	2019	II	2024				
梓川57号橋	2.1	BOX	梓川	1969	2020	II	2025				
梓川58号橋	2.1	RC橋	梓川	1972	2020	II	2025				
梓川59号橋	2.2	RC橋	梓川	1972	2019	II	2024				
梓川63号橋	2.1	RC橋	梓川	1971	2019	II	2024				
梓川65号橋	2.1	BOX	梓川	1992	2019	II	2024				
梓川66号橋	2.1	BOX	梓川	1993	2021	III	2026		2025	2025	修繕
梓川68号橋	3.0	RC橋	梓川	1984	2019	II	2024				
梓川70号橋	4.2	PC橋	梓川	1985	2021	II	2026				
梓川72号橋	3.0	RC橋	梓川	1990	2019	II	2024				
梓川74号橋	8.4	BOX	梓川	2002	2021	II	2026				
梓川78号橋	2.1	BOX	梓川	2001	2019	II	2024				
梓川80号橋	2.4	RC橋	梓川	1990	2019	II	2024				
梓川83号橋	2.0	RC橋	梓川	1980	2021	II	2026				
梓川84号橋	2.0	BOX	梓川	2003	2019	II	2024				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容
梓川85号橋	3.2	RC橋	梓川	1980	2021	Ⅲ	2026			(2022)	(修繕済)
梓川86号橋	3.2	RC橋	梓川	1984	2021	Ⅱ	2026				
梓川87号橋	2.9	RC橋	梓川	1986	2020	Ⅱ	2025				
梓川88号橋	2.3	BOX	梓川	1999	2019	Ⅱ	2024				
梓川89号橋	2.7	RC橋	梓川	2002	2021	Ⅱ	2026				
梓川91号橋	2.0	BOX	梓川	2000	2020	Ⅱ	2025				
梓川92号橋	2.2	RC橋	梓川	1985	2020	Ⅱ	2025				
梓川93号橋	2.3	RC橋	梓川	1985	2021	Ⅱ	2026				
梓川94号橋	4.3	RC橋	梓川	1999	2020	Ⅱ	2025				
梓川96号橋	4.3	RC橋	梓川	1987	2020	Ⅱ	2025				
梓川100号橋	2.6	RC橋	梓川	1986	2020	Ⅱ	2025				
梓川102号橋	2.0	BOX	梓川	1984	2020	Ⅱ	2025				
梓川104号橋	3.4	RC橋	梓川	2001	2020	Ⅱ	2025				
梓川107号橋	2.8	RC橋	梓川	1973	2020	Ⅱ	2025				
梓川111号橋	2.4	RC橋	梓川	1974	2021	Ⅱ	2026				
梓川117号橋	4.0	BOX	梓川	2003	2021	Ⅱ	2026				
梓川118号橋	11.2	BOX	梓川	1984	2021	Ⅱ	2026				
梓川119号橋	7.9	BOX	梓川	2002	2021	Ⅱ	2026				
梓川123号橋	2.0	BOX	梓川	2002	2020	Ⅰ	2025				
0002号橋	4.1	BOX	波田	1982	2020	Ⅱ	2025				
0004号橋	3.5	BOX	波田	1983	2020	Ⅱ	2025				
0005号橋	4.4	RC橋	波田	1983	2020	Ⅱ	2025				
0006号橋	3.3	RC橋	波田	1992	2020	Ⅱ	2025				
0007号橋	3.3	BOX	波田	不明	2020	Ⅱ	2025				
0008号橋	3.6	RC橋	波田	1982	2020	Ⅱ	2025				
0010号橋	4.1	RC橋	波田	1982	2020	Ⅱ	2025				
0011号橋	4.0	RC橋	波田	1980	2020	Ⅱ	2025				
0013号橋	4.0	RC橋	波田	1989	2020	Ⅱ	2025				
0014号橋	4.0	RC橋	波田	1989	2020	Ⅱ	2025				
0015号橋	3.4	RC橋	波田	1990	2020	Ⅱ	2025				
0016号橋	3.1	RC橋	波田	1993	2020	Ⅱ	2025				
0017号橋	3.8	RC橋	波田	1990	2020	Ⅲ	2025		2027	2027	修繕
0019号橋	3.1	RC橋	波田	1984	2022	Ⅱ	2027				
0021号橋	3.1	RC橋	波田	1991	2020	Ⅱ	2025				
0022号橋	3.3	RC橋	波田	1992	2020	Ⅱ	2025				
0023号橋	3.4	RC橋	波田	1986	2020	Ⅱ	2025				
0025号橋	3.2	RC橋	波田	1983	2020	Ⅱ	2025				
0027号橋	3.5	RC橋	波田	1984	2020	Ⅱ	2025				
0028号橋	3.4	RC橋	波田	1974	2020	Ⅱ	2025				
0031号橋	3.4	RC橋	波田	1974	2020	Ⅱ	2025				
0033号橋	4.7	BOX	波田	2003	2020	Ⅰ	2025				
0039号橋	2.3	BOX	波田	1984	2022	Ⅱ	2027				
0040号橋	4.2	BOX	波田	1984	2022	Ⅰ	2027				
0041号橋	4.3	RC橋	波田	1985	2022	Ⅱ	2027				
0042号橋	3.9	RC橋	波田	1989	2023	Ⅱ	2027				
0043号橋	3.0	RC橋	波田	1985	2022	Ⅱ	2027				
0044号橋	2.2	BOX	波田	1984	2022	Ⅰ	2027				
0045号橋	3.0	BOX	波田	1992	2022	Ⅰ	2027				
0046号橋	3.0	BOX	波田	1992	2022	Ⅱ	2027				
0047号橋	2.5	RC橋	波田	1992	2023	Ⅰ	2027				
0048号橋	2.1	BOX	波田	1993	2022	Ⅱ	2027				
0049号橋	2.1	BOX	波田	1993	2023	Ⅱ	2027				
0050号橋	2.3	BOX	波田	1993	2022	Ⅱ	2027				
0051号橋	2.5	BOX	波田	1993	2022	Ⅱ	2027				
0052号橋	2.5	BOX	波田	1993	2022	Ⅱ	2027				
0053号橋	2.6	BOX	波田	1993	2023	Ⅱ	2027				
0060号橋	5.0	鋼橋	波田	1992	2023	Ⅱ	2027				
0061号橋	4.1	鋼橋	波田	1984	2023	Ⅱ	2027				

非
公
開

橋長5m未満の車道橋・歩道橋

※実施時期及び内容は施設の状況や財政状況等により変更することがあります。

橋長5m以上の歩道橋、カルバート

※対策着手・完了年度のうち、() 書きは実施済み

施設名称	橋長 (m)	橋種	所在地	架設 年度	直近 点検 年度	判定 区分	次回 点検 年度	概算費用 (百万円)	対策 着手 年度	対策 完了 年度	対策内容	
0062号橋	4.1	鋼橋	波田	1984	2023	Ⅱ	2027	非 公 開				
0063号橋	3.8	RC橋	波田	1992	2022	Ⅱ	2027					
0065号橋	4.2	BOX	波田	2002	2023	Ⅱ	2027					
0069号橋	2.3	RC橋	波田	1974	2021	Ⅱ	2026					
0070号橋	3.4	RC橋	波田	1985	2022	Ⅱ	2027					
0072号橋	2.5	BOX	波田	1992	2022	Ⅱ	2027					
0074号橋	2.5	RC橋	波田	1985	2023	Ⅱ	2027					
0075号橋	5.4	RC橋	波田	1982	2022	Ⅱ	2027					
0076号橋	3.9	RC橋	波田	1982	2023	Ⅱ	2027					
0078号橋	4.2	BOX	波田	1983	2022	Ⅱ	2027					
0082号橋	4.6	BOX	波田	1998	2021	Ⅲ	2026			2028	2028	修繕
0083号橋	3.6	RC橋	波田	1989	2022	Ⅱ	2027					
0085号橋	4.4	RC橋	波田	1989	2022	Ⅱ	2027					
0086号橋	3.3	RC橋	波田	1971	2020	Ⅱ	2025					
0090号橋	2.9	RC橋	波田	1973	2023	Ⅱ	2027					
0092号橋	2.3	RC橋	波田	1972	2020	Ⅱ	2025					
0093号橋	2.3	BOX	波田	1972	2022	Ⅰ	2027					
0097号橋	2.2	RC橋	波田	1984	2022	Ⅱ	2027					
0098号橋	2.0	RC橋	波田	1984	2023	Ⅰ	2027					
0099号橋	2.2	RC橋	波田	1984	2022	Ⅰ	2027					
0100号橋	2.4	RC橋	波田	1972	2023	Ⅱ	2027					
0101号橋	2.7	RC橋	波田	1972	2023	Ⅱ	2027					
0102号橋	3.8	RC橋	波田	1971	2023	Ⅲ	2027			2028	2028	修繕
0103号橋	2.0	RC橋	波田	1990	2023	Ⅱ	2027					
0104号橋	2.5	BOX	波田	1983	2021	Ⅱ	2026					
0105号橋	2.6	BOX	波田	1983	2022	Ⅱ	2027					
